



## Renouvellement de la conduite de refoulement entre la station du Lavoir et le Château d'eau du Breuil à Cognac

Cognac,  
le 15/02/2019

## *PHASAGE DES TRAVAUX*

- *Phase 1* : Place du lavoir / Rue de la Fontaine d'Enfer / Allée de l'Atrie
- *Phase 2* : Rue de la Pyramide
- *Phase 3* : Rue du Chatenay / Bd du Chatenay
- *Phase 4* : Rue de Melbourne
- *Phase 5* : Raccordements

- *Départ Place du Lavoir sur le débitmètre existant.*
- *Remontée vers la rue de la Fontaine d'Enfer en lieu et place de la conduite DN 250 mm existante.*
- *Mise en place de la conduite en deux phases sur la Fontaine d'Enfer en lieu et place de la conduite existante.*
- *Mise en place de la conduite en une phase sur Allée de l'Atrie*
- *Emplacement envisagé de la base vie au niveau des places de parking Place du lavoir, zone de stockage dans la zone de travaux et au croisement Fontaine d'Enfer / Allée de l'Atrie*





Date : 11/03 – 22/03

## Travaux Place du Lavoir

Tourne à gauche depuis rue de la Fontaine d'Enfer vers place du Lavoir interdit.

Déviation par rue Jean Bart.

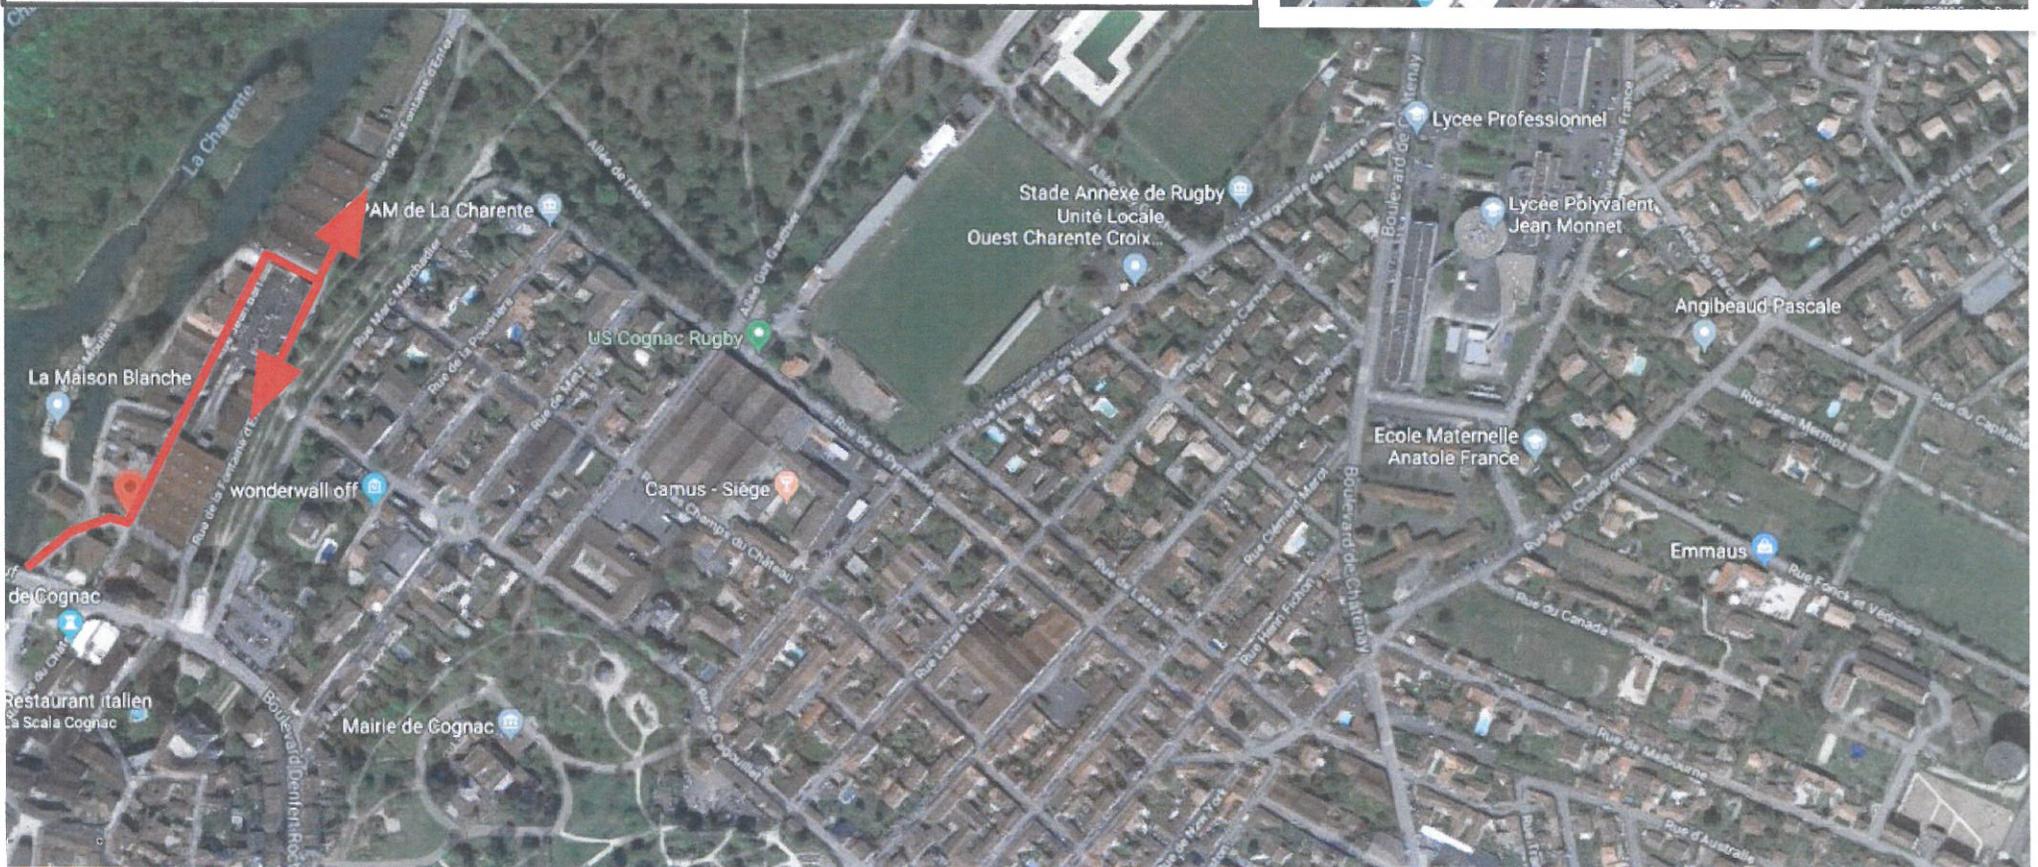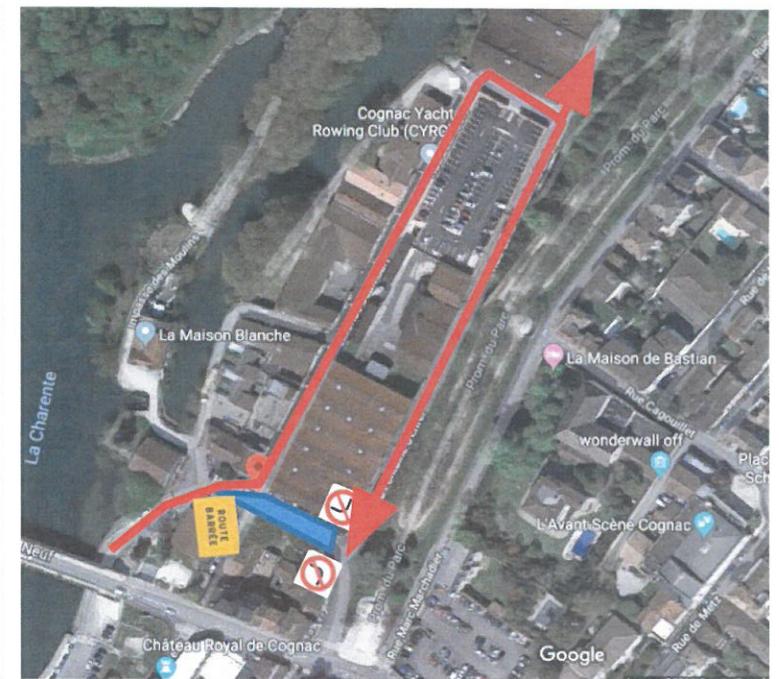


Date : 18/03 – 27/03

## Travaux Rue de La Fontaine d'Enfer (phase 1)

Tourne à droite depuis rue Jean Bart vers rue de la Fontaine d'Enfer interdit.

Déviation depuis la rue de la Fontaine d'Enfer vers l'Allée de l'Atrie puis rue de la Pyramide et Marc Marchadier pour récupérer le Bd Denfert Rochereau.

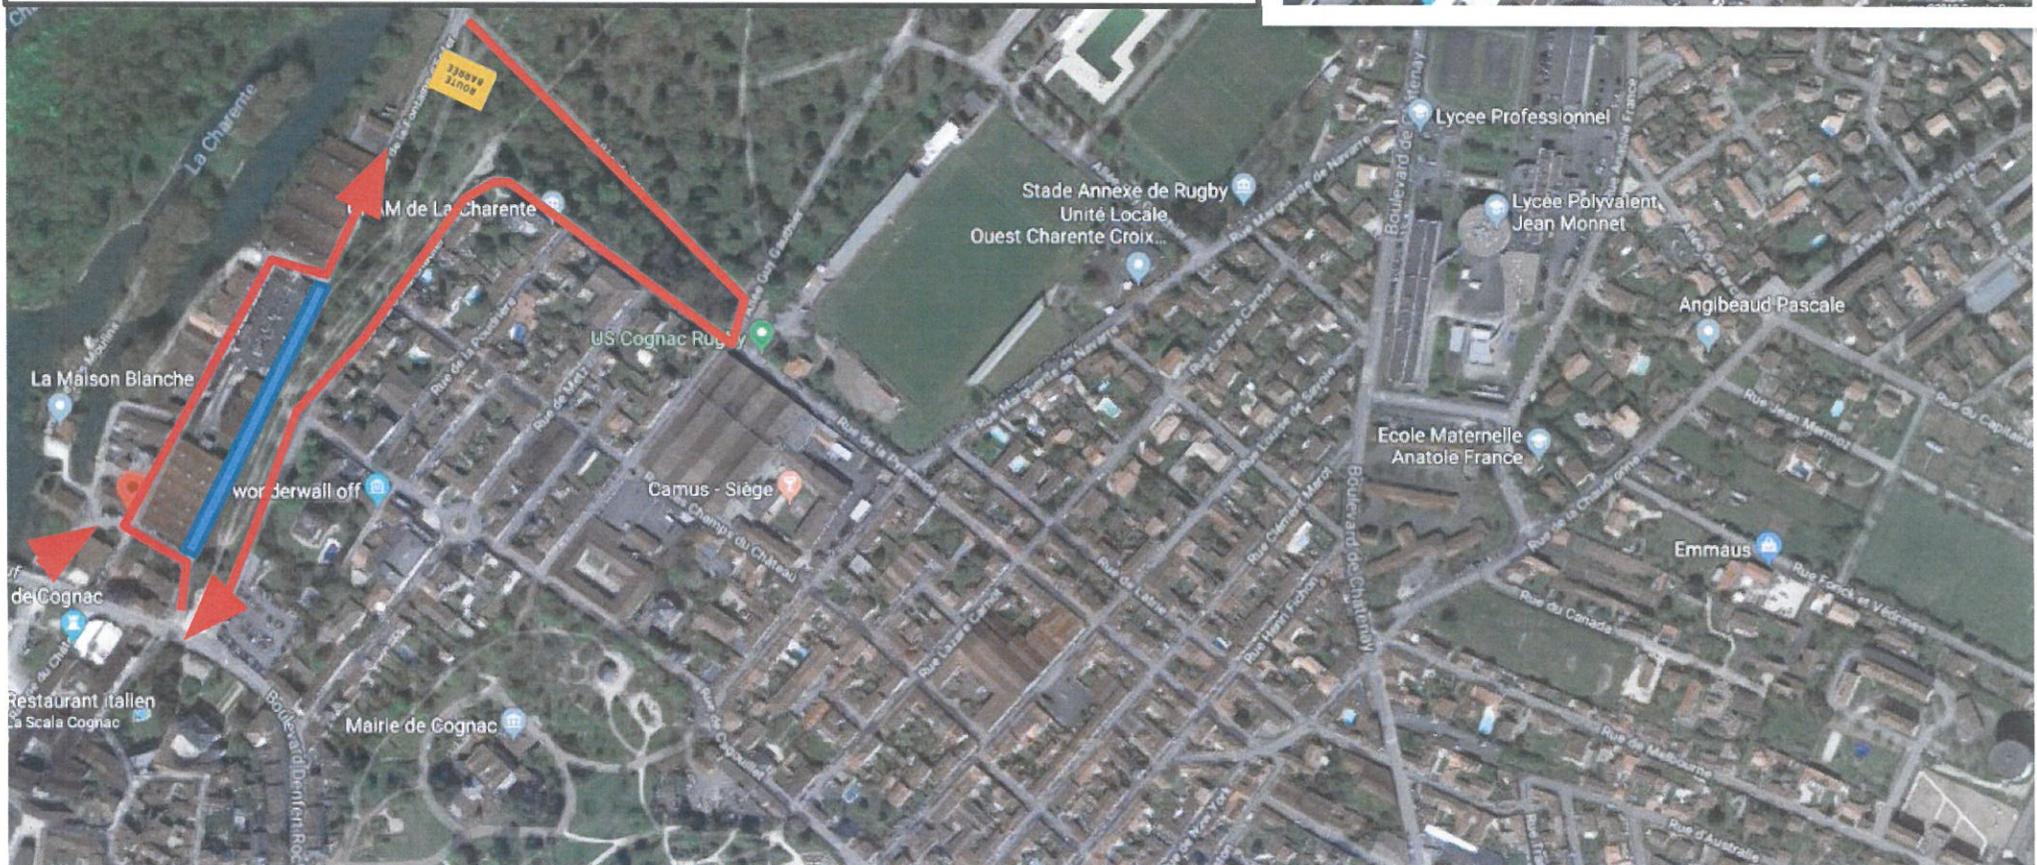


Date : 28/03 – 09/04

## Travaux Rue de La Fontaine d'Enfer (phase2)

Tourne à gauche depuis rue Jean Bart vers rue de la Fontaine d'Enfer interdit.

Déviation depuis la rue de la Fontaine d'Enfer vers l'Allée de l'Atrie puis rue de la Pyramide et Marc Marchadier pour récupérer le Bd Denfert Rochereau.

Déviation depuis le Bd Denfert Rochereau vers rue de Metz puis rue Cagouillet et rue du Prévost de Sansac vers l'Allée de l'Atrie pour récupérer la rue de la Fontaine d'Enfer.

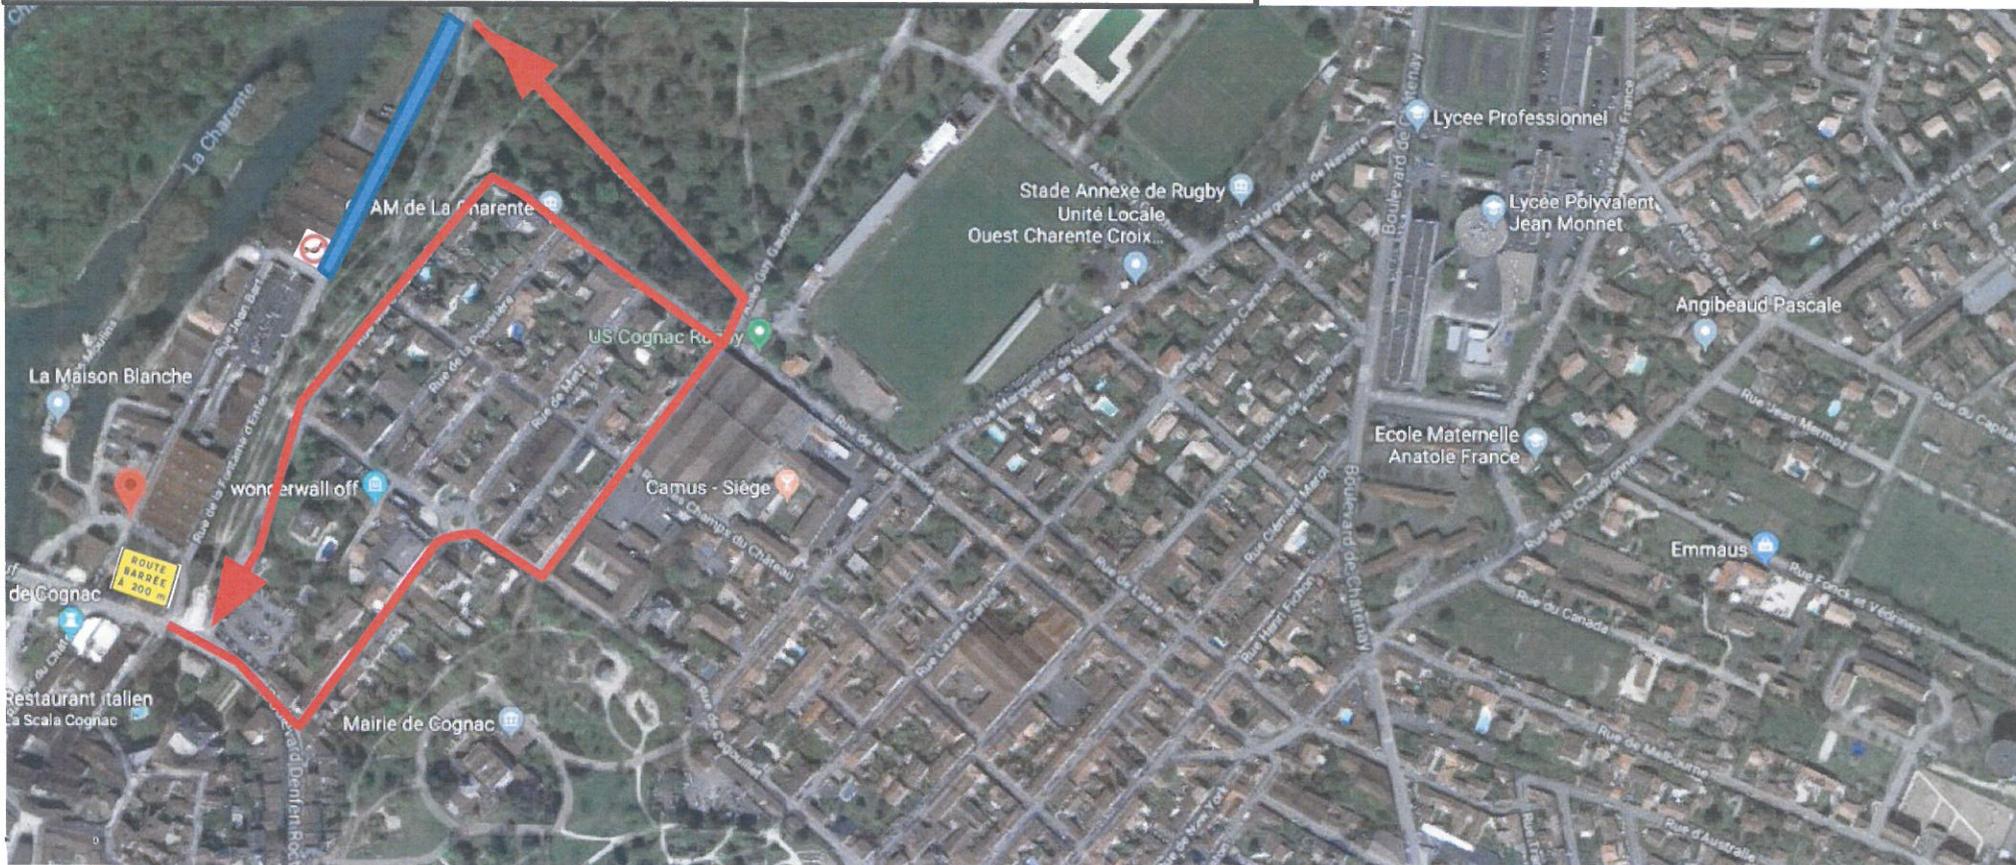



Date : 10/04 – 30/04

## Travaux Allée de L'Atrie

Accès à l'allée de l'Atrie depuis rue de la Fontaine d'Enfer et allée Guy Gauthier interdite.

Déviation depuis l'allée Guy Gauthier vers rue de la Pyramide et Marc Marchadier pour récupérer le Bd Denfert Rochereau et ensuite la rue de la Fontaine d'Enfer.

Déviation depuis la rue de la Fontaine d'Enfer vers le Bd Denfert Rochereau vers rue de Metz puis rue Cagouillet et rue du Prévost de Sansac pour récupérer l'allée Guy Gauthier.

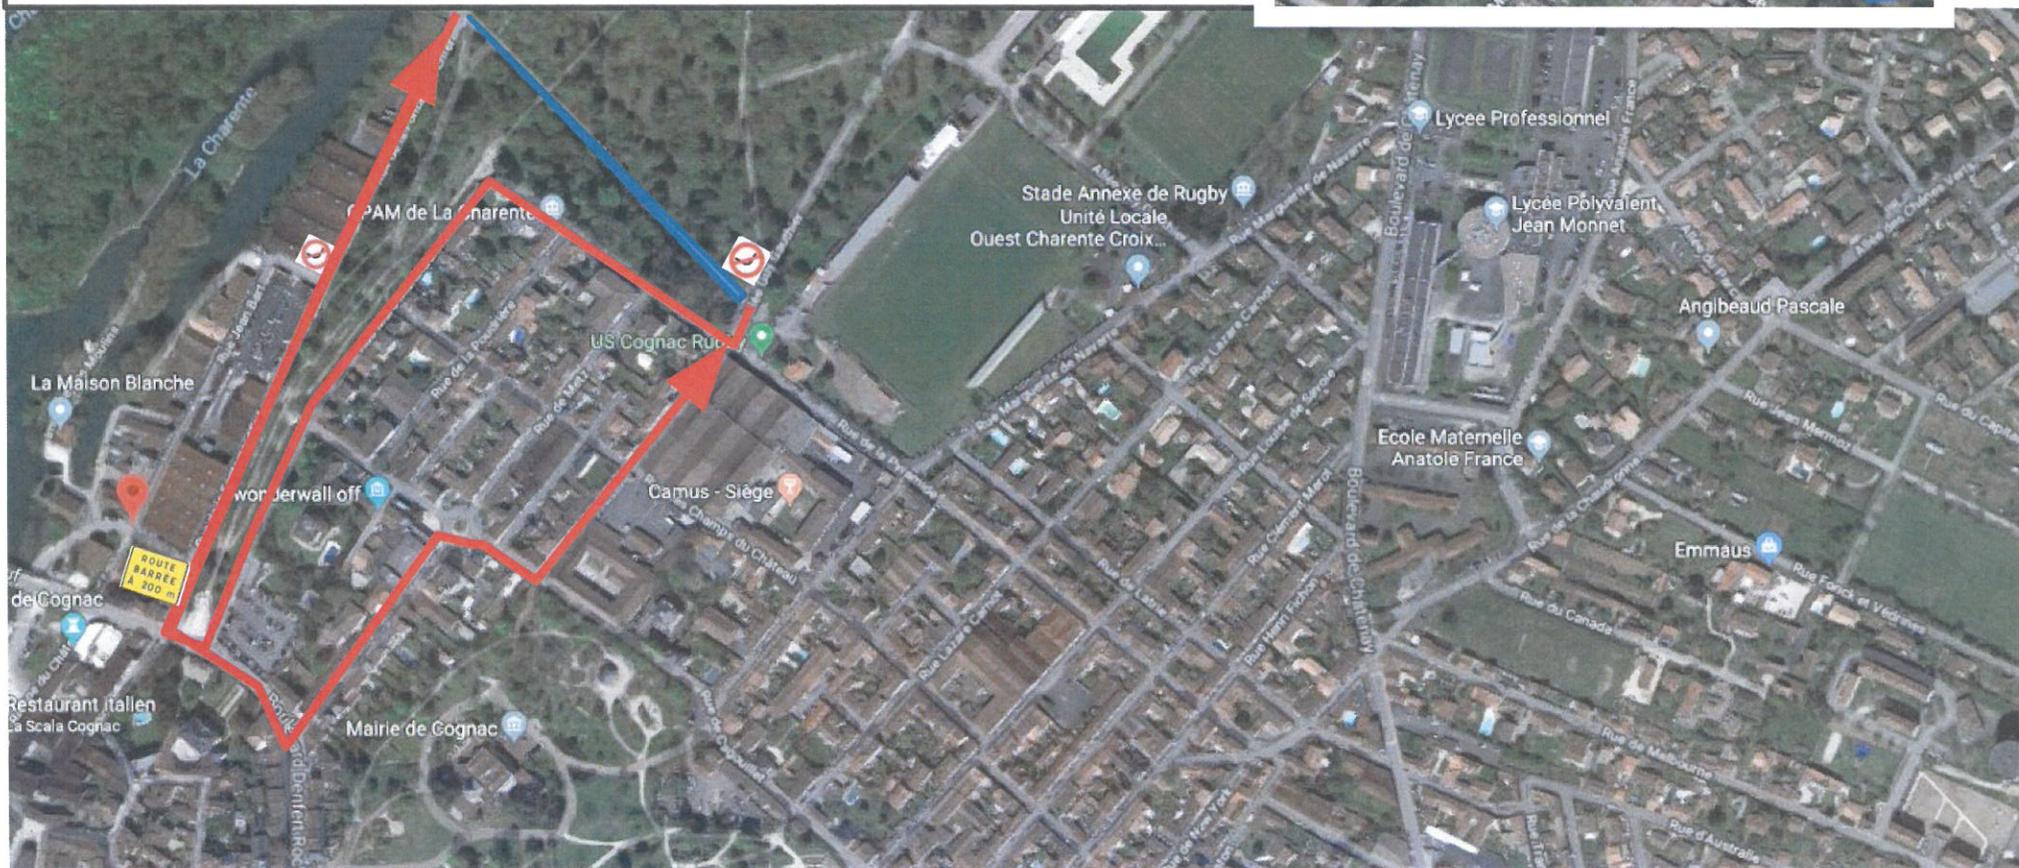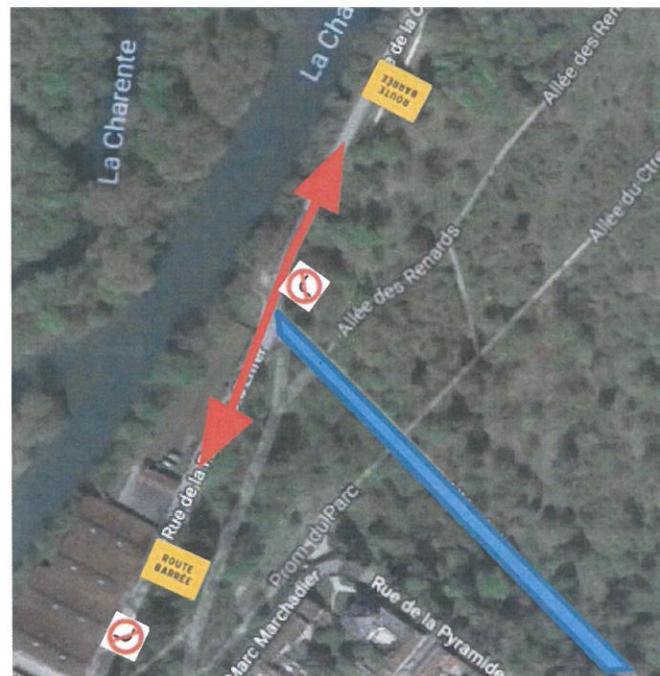



- *Continuation de l'Allée de l'Atrie à la rue de la Pyramide par l'Allée Guy Gauthier*
- *Réalisation de la première phase jusqu'au croisement rue de la Pyramide / Rue Marguerite de Navarre en rue barrée. Reprise des travaux en lieu et place de la conduite existante.*
- *Carrefour (Pyramide/Marguerite de Navarre) phasé en deux demi chaussées*
- *Pose de la conduite jusqu'à rue du Chatenay en deux phases en rue barrée.*
- *Zone de stockage au croisement Guy Gauthier et rue de la Pyramide*


Date : 29/04 – 02/05

## Travaux Allée Guy Gauthier

Tourne à Droite depuis rue de la Pyramide vers l'allée Guy Gauthier interdit.

Déviation depuis la Pyramide et Marc Marchadier pour récupérer le Bd Denfert Rochereau vers la rue de la Fontaine d'Enfer et l'allée de l'Atrie.

Déviation depuis l'allée Guy Gauthier vers l'allée Guy Gauthier et la rue Marguerite de Navarre pour récupérer la rue de la Pyramide.

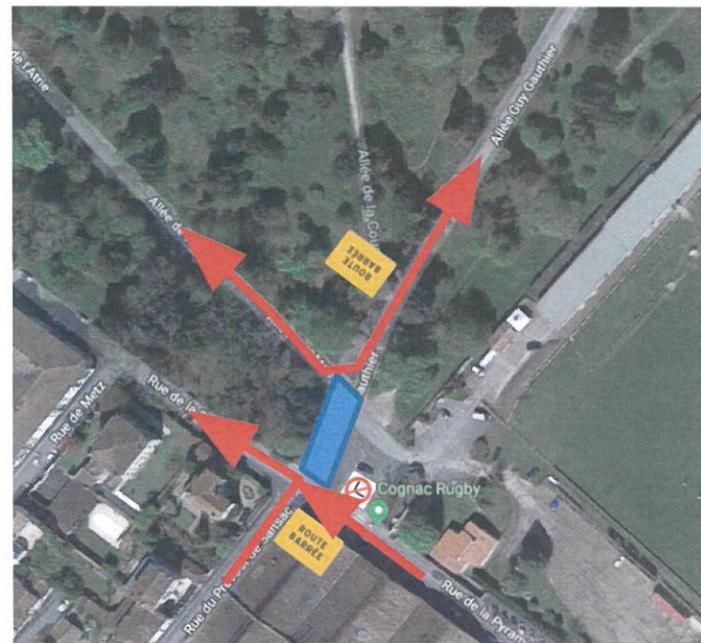


Date : 03/05 – 14/05

## Travaux Rue de La Pyramide(phase 1)

Tourne à gauche depuis la rue Marguerite de Navarre interdit vers rue de la Pyramide.

Déviation depuis la rue de la Pyramide vers la rue Lazare Carnot et la rue Cagouillet puis la rue du Prévost Sansac pour récupérer la rue de la Pyramide.

Déviation depuis la rue Marguerite de Navarre vers rue St-François puis rue Lazare Carnot pour récupérer la rue de la Pyramide.


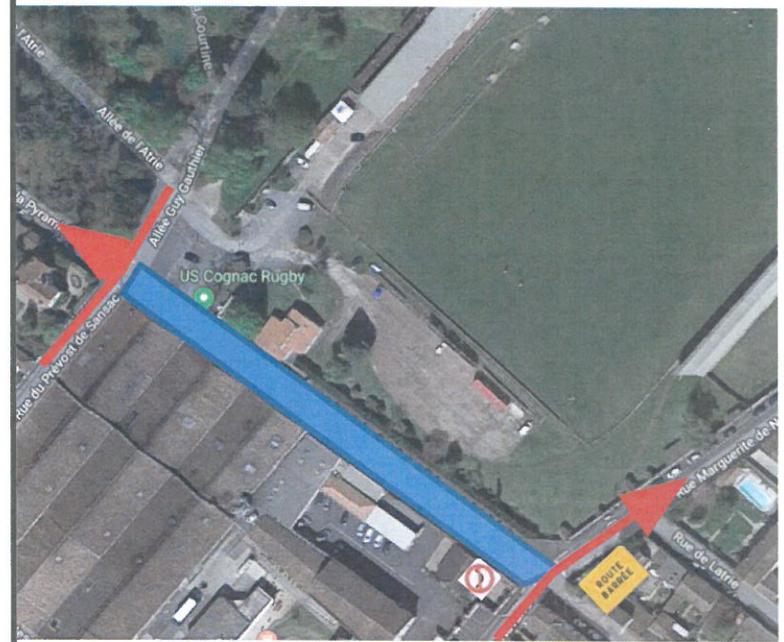


Date : 15/05 – 23/05

## Travaux Rue de La Pyramide(phase 2)

Tourne à gauche depuis rue Louise de Savoie vers rue de la Pyramide interdit.

Déviation depuis la rue de la Pyramide vers la rue Louise de Savoie puis rue St-François et rue de Margueritte de Navarre pour récupérer la rue de la Pyramide.

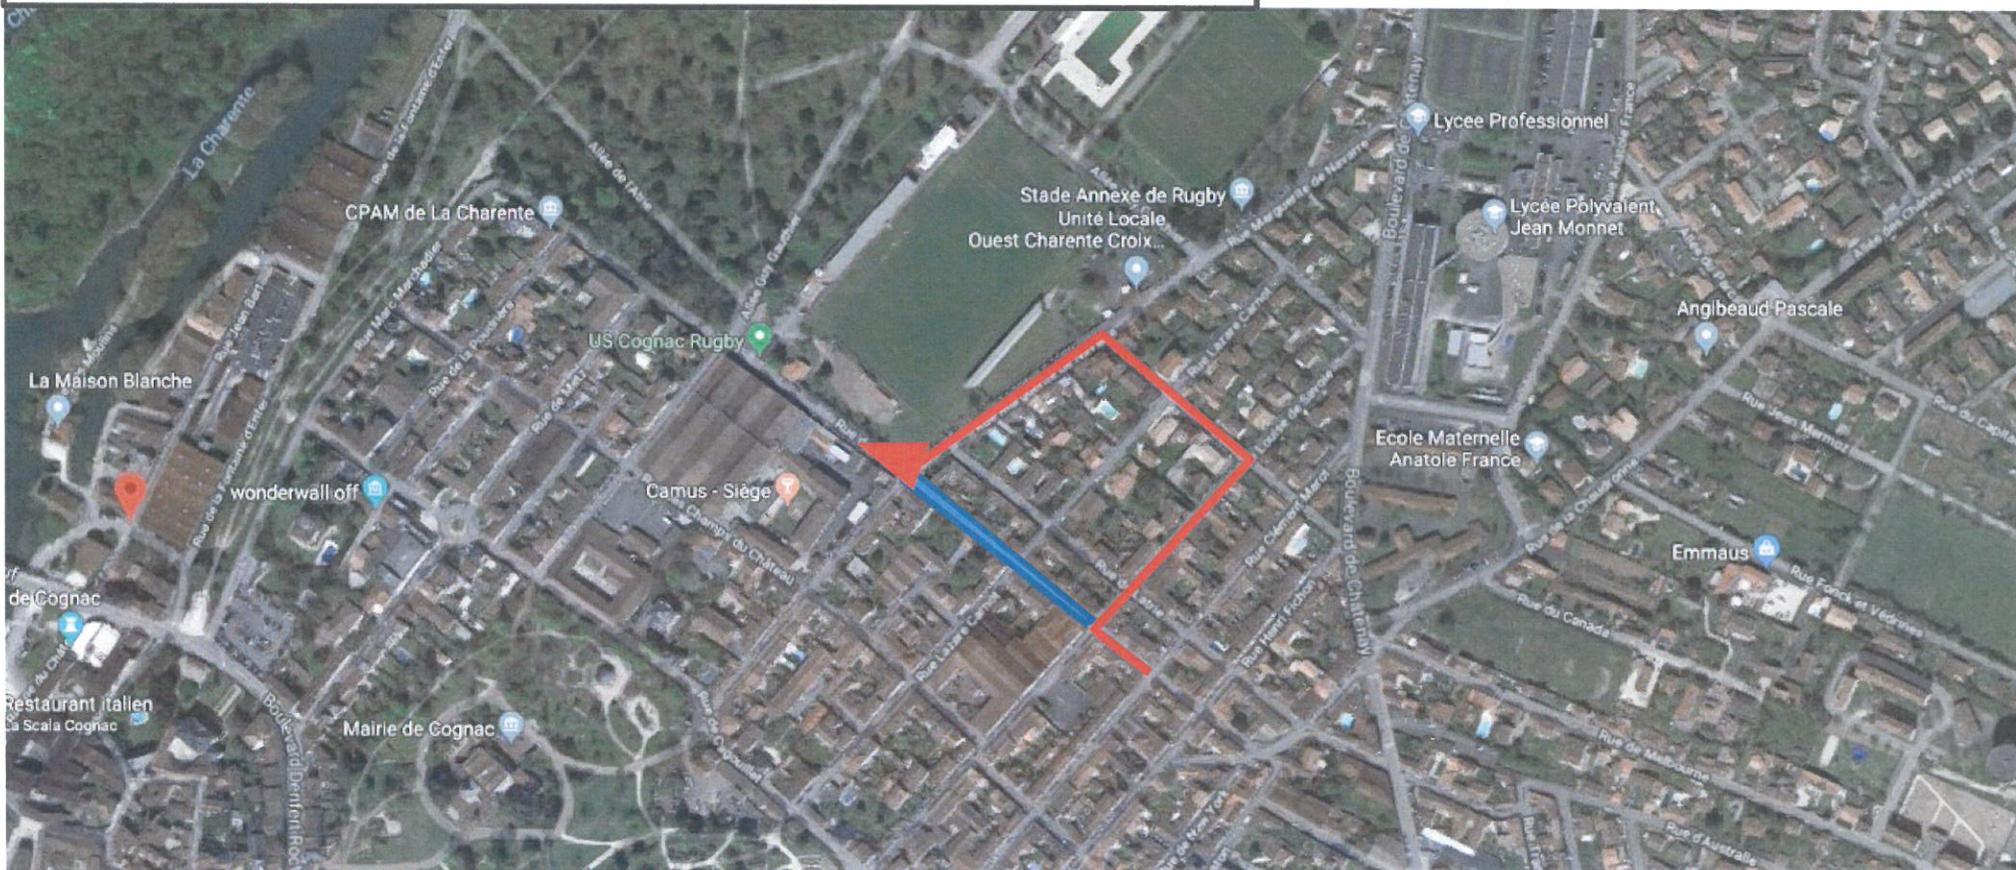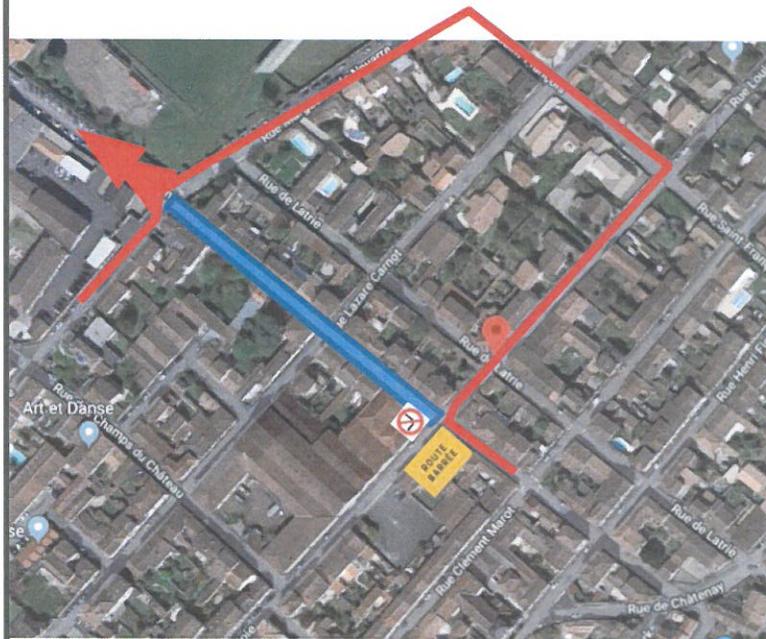


Date : 23/05-31/05

## Travaux Rue de La Pyramide(phase3)


Tourne à gauche depuis rue du Chatenay vers rue la Pyramide interdit.

Déviation depuis la rue du Chatenay vers le Boulevard du Chatenay puis la rue St-François et la rue Lazare Carnot pour récupérer la rue de la Pyramide.

Déviation depuis la rue Henri Fichon vers la rue Jean Goujon puis Louise de Savoie pour récupérer la rue de la Pyramide.

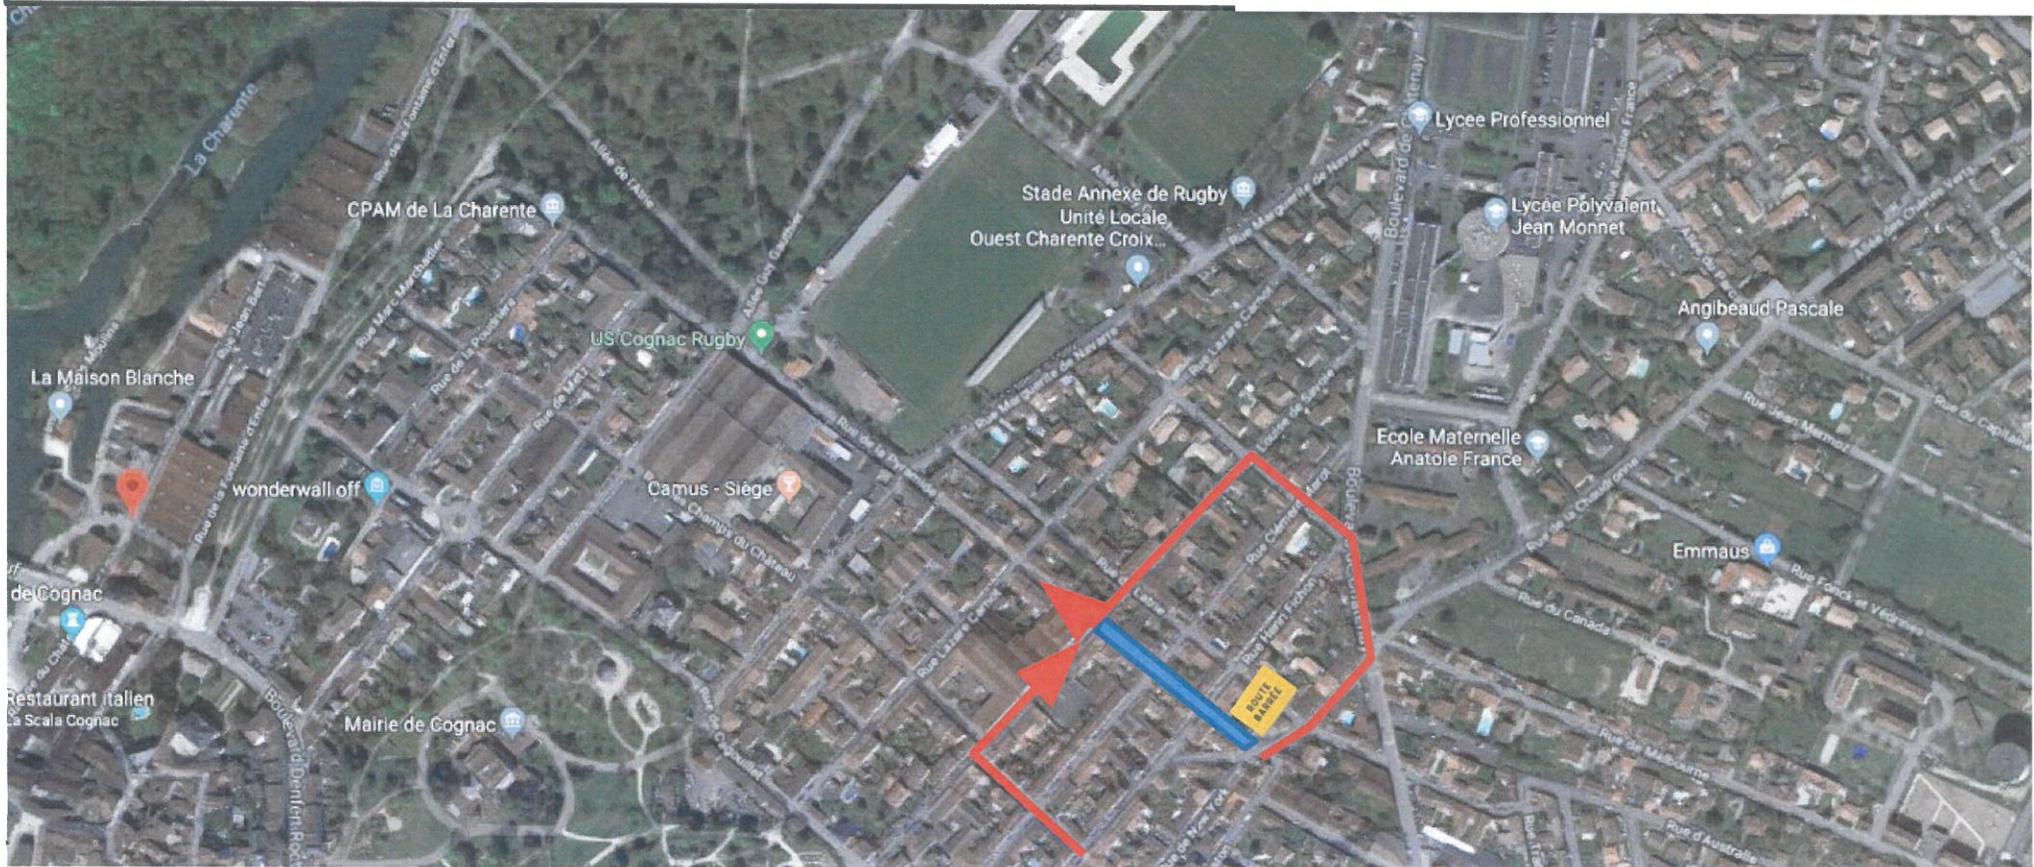

- *Travaux réalisés pendant les congés scolaires semaines 16 et 17*
- *Mise en place de la conduite en une phase rue du Chatenay en rue barrée, en lieu et place de l'existante.*
- *Traversé du Bd du Chatenay en deux demi chaussées avec alternat de circulation.*
- *Mise en attente de la canalisation rue de Melbourne, en lieu et place de l'existante.*
- *Zone de stockage sur les stationnement de l'Ecole Maternelle (fermée)*

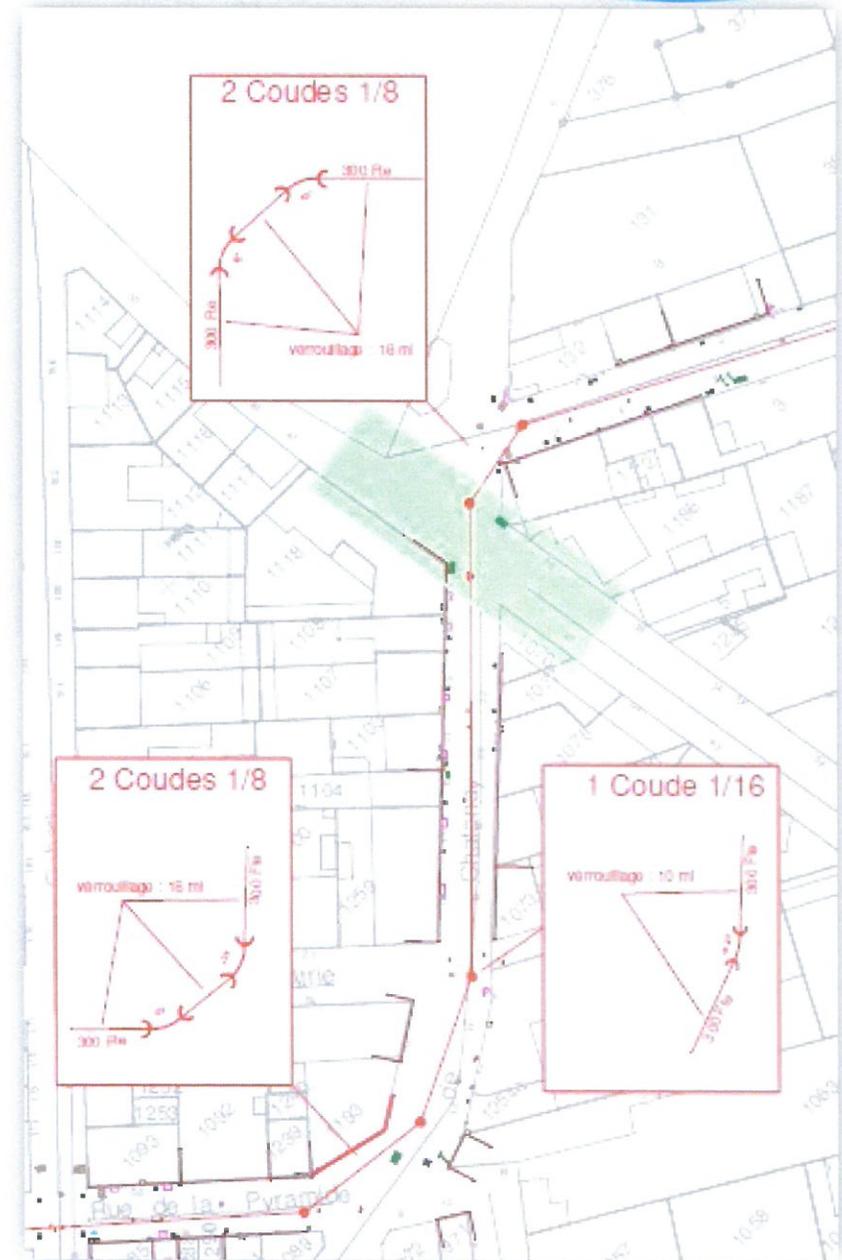


Date : 23/05-31/05

## Travaux Rue du Chatenay

Tourne à gauche depuis rue du Chatenay vers rue la Pyramide interdit.

Déviation depuis la rue du Chatenay vers le Boulevard du Chatenay puis la rue St-François et la rue Lazare Carnot pour récupérer la rue de la Pyramide.

Déviation depuis la rue Henri Fichon vers la rue Jean Goujon puis Louise de Savoie pour récupérer la rue de la Pyramide.

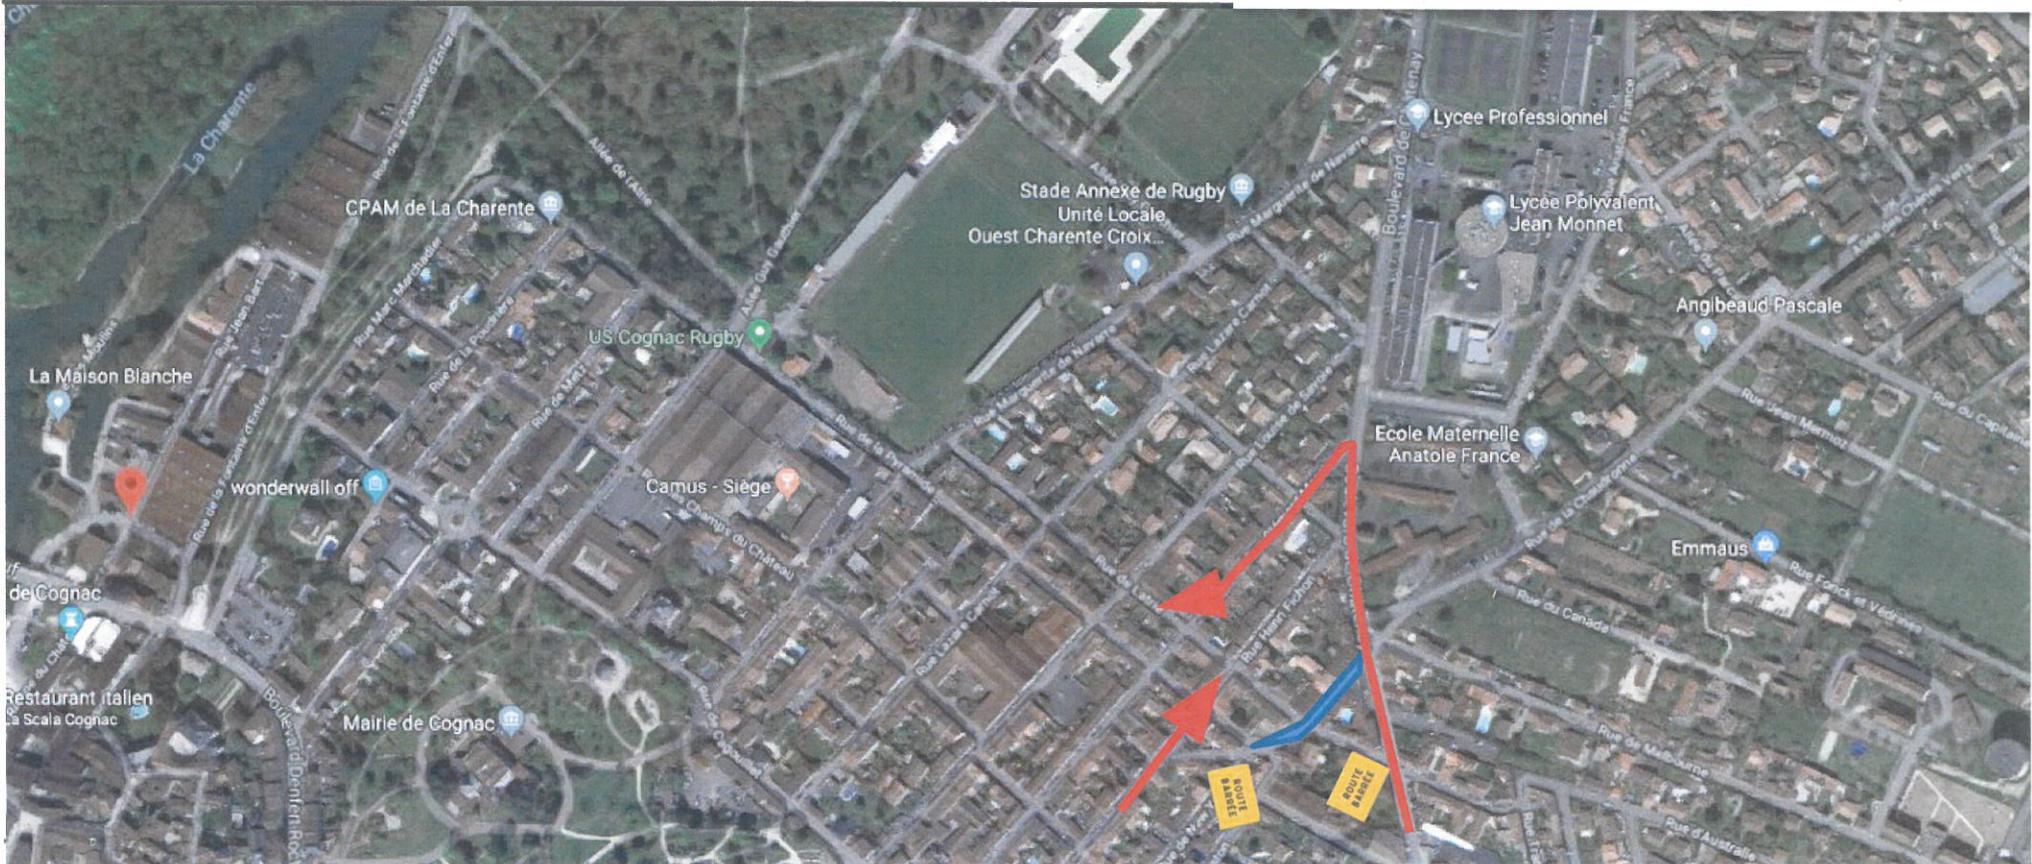

Date : 17/04 – 19/04

## Travaux Bd du Chatenay (phase 1)

Mise en place de feu tricolore de chantier.

Travail par demi-chaussée avec réfection de voirie provisoire avant réouverture à la circulation.



Date : 22/04 – 24/04

## Travaux Bd du Chatenay (phase 2)

Mise en place de feu tricolore de chantier.

Travail par demi-chaussée avec réfection de voirie provisoire avant réouverture à la circulation.

Les réfections définitives seront réalisées avec le même mode opératoire.








- *Reprise sur la canalisation en attente laissée lors de la traversé du Bd de Chatenay*
- *Pose de la canalisation en une seule phase en rue barrée depuis la rue de du Château d'Eau, en lieu et place de l'existante.*
- *Mise en place de la base vie et zone de stockage sur le stationnement rue de Roland Garros, où au réservoir du Breuil.*



# PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

PLANNING D'EXECUTION DES TRAVAUX Indice B

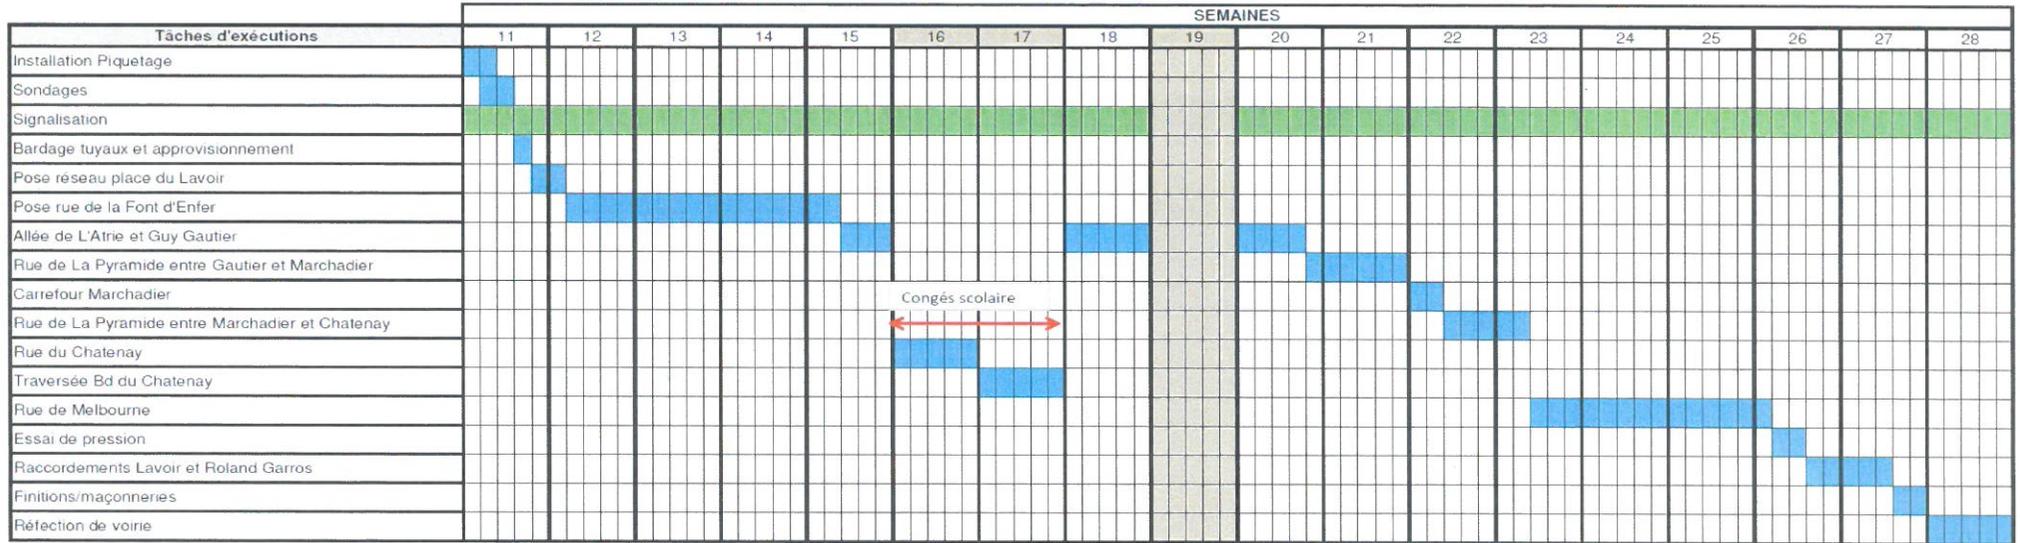


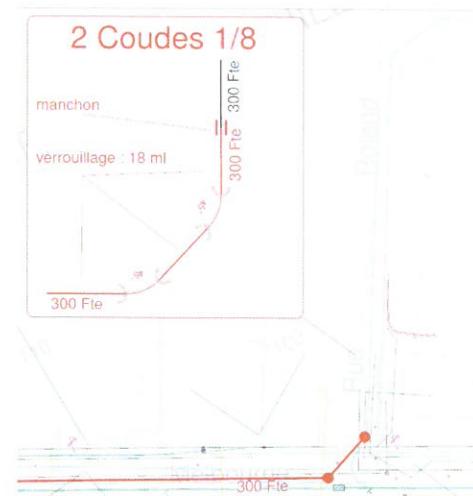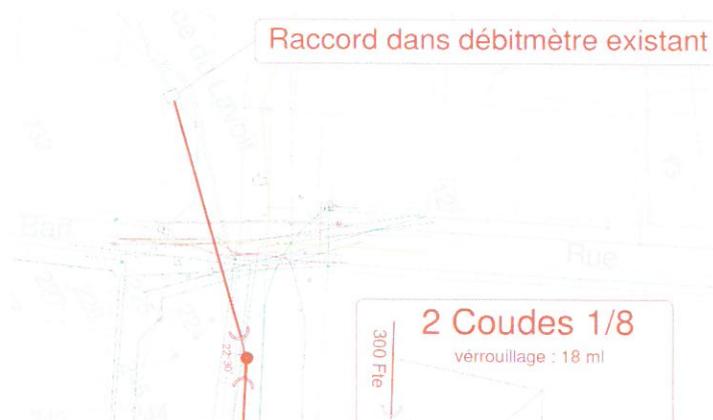

- *Essai d'étanchéité et analyse bactériologique*
- *Raccordement Place du Lavoisier, avant le débitmètre.*
- *Raccordement Rue de Melbourne, sur la conduite DN 300 mm, au carrefour de la Rue Roland Garros .*

# PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

## PLANNING D'EXECUTION DES TRAVAUX Indice B

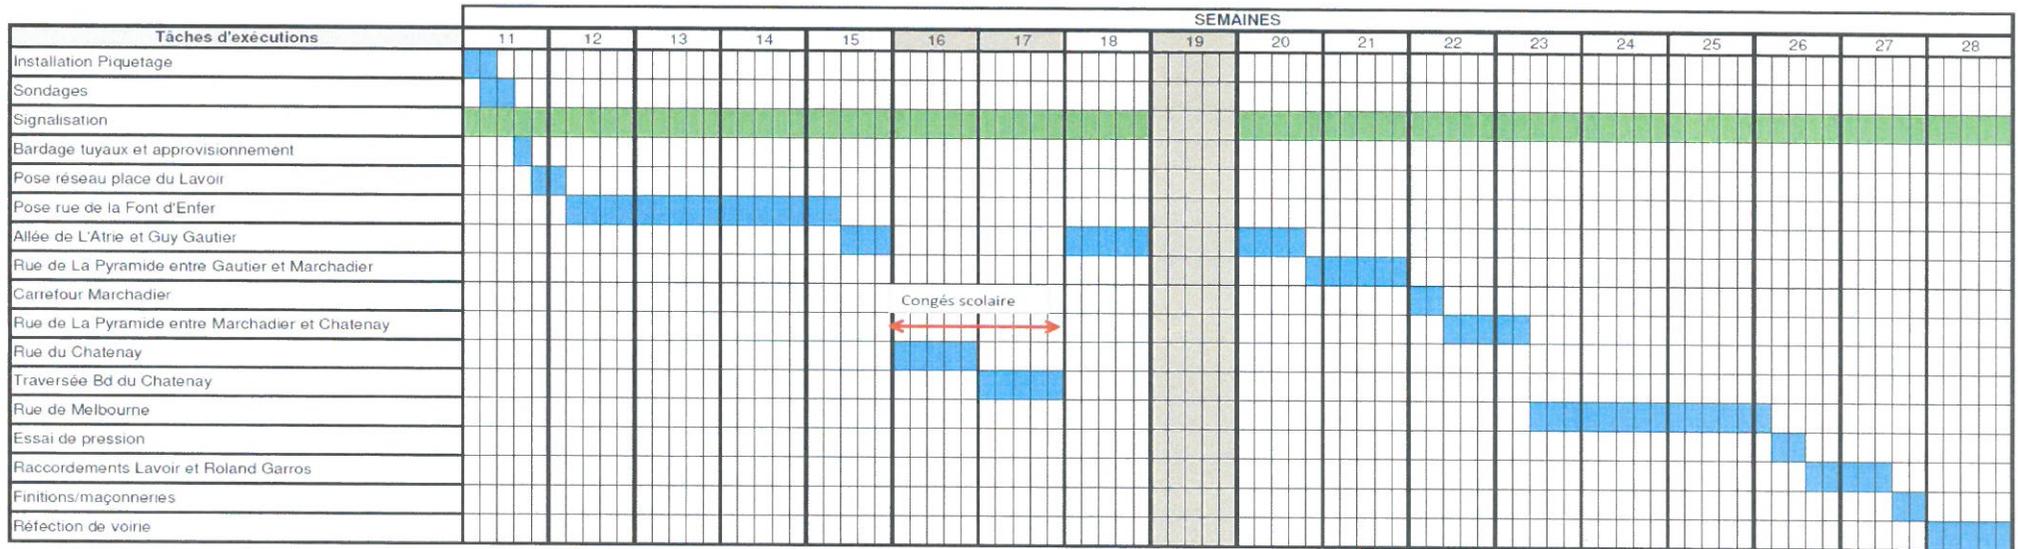

# PRÉPARATION DE CHANTIER

Constat d'huissier

Marquage piquetage (phase 1)

Planning approvisionnement des canalisations

Retour permission de voirie

Sondages au démarrage des travaux
